

災害復旧事業の 進捗状況について

- ・ 河川、道路 … 1P
- ・ 農道、林道、治山 … 5P

令和4年台風15号による被災状況及び対応状況

1月31日現在

河川

		葵区		駿河区	清水区	計	
		河川課		河川課	土木事務所		
被災箇所数		401		58	310	769	(箇所)
(うち、公共災害)		33		1	12	46	(箇所)
内 訳	土砂堆積	278		43	207	528	(箇所)
	法面・護岸崩壊	41		3	65	109	(箇所)
	その他	82		12	38	132	(箇所)
対応完了数		341		51	264	656	(箇所)

道路

		葵区		駿河区	清水区	計	
		葵南道路 整備課	葵北道路 整備課	駿河道路 整備課	清水道路 整備課		
被災箇所数		357	126	127	574	1184	(箇所)
(うち、公共災害)		18	12	1	28	59	(箇所)
内 訳	法面崩壊	36	5	4	80	125	(箇所)
	路肩決壊	31	15	4	89	139	(箇所)
	倒木	14	6	3	27	50	(箇所)
	土砂堆積	276	100	116	378	870	(箇所)
対応完了数		331	114	120	539	1104	(箇所)

被災箇所数
河川・道路計


1953

(箇所)



令和4年9月 台風15号による主な被災状況（道路）

令和5年1月31日現在

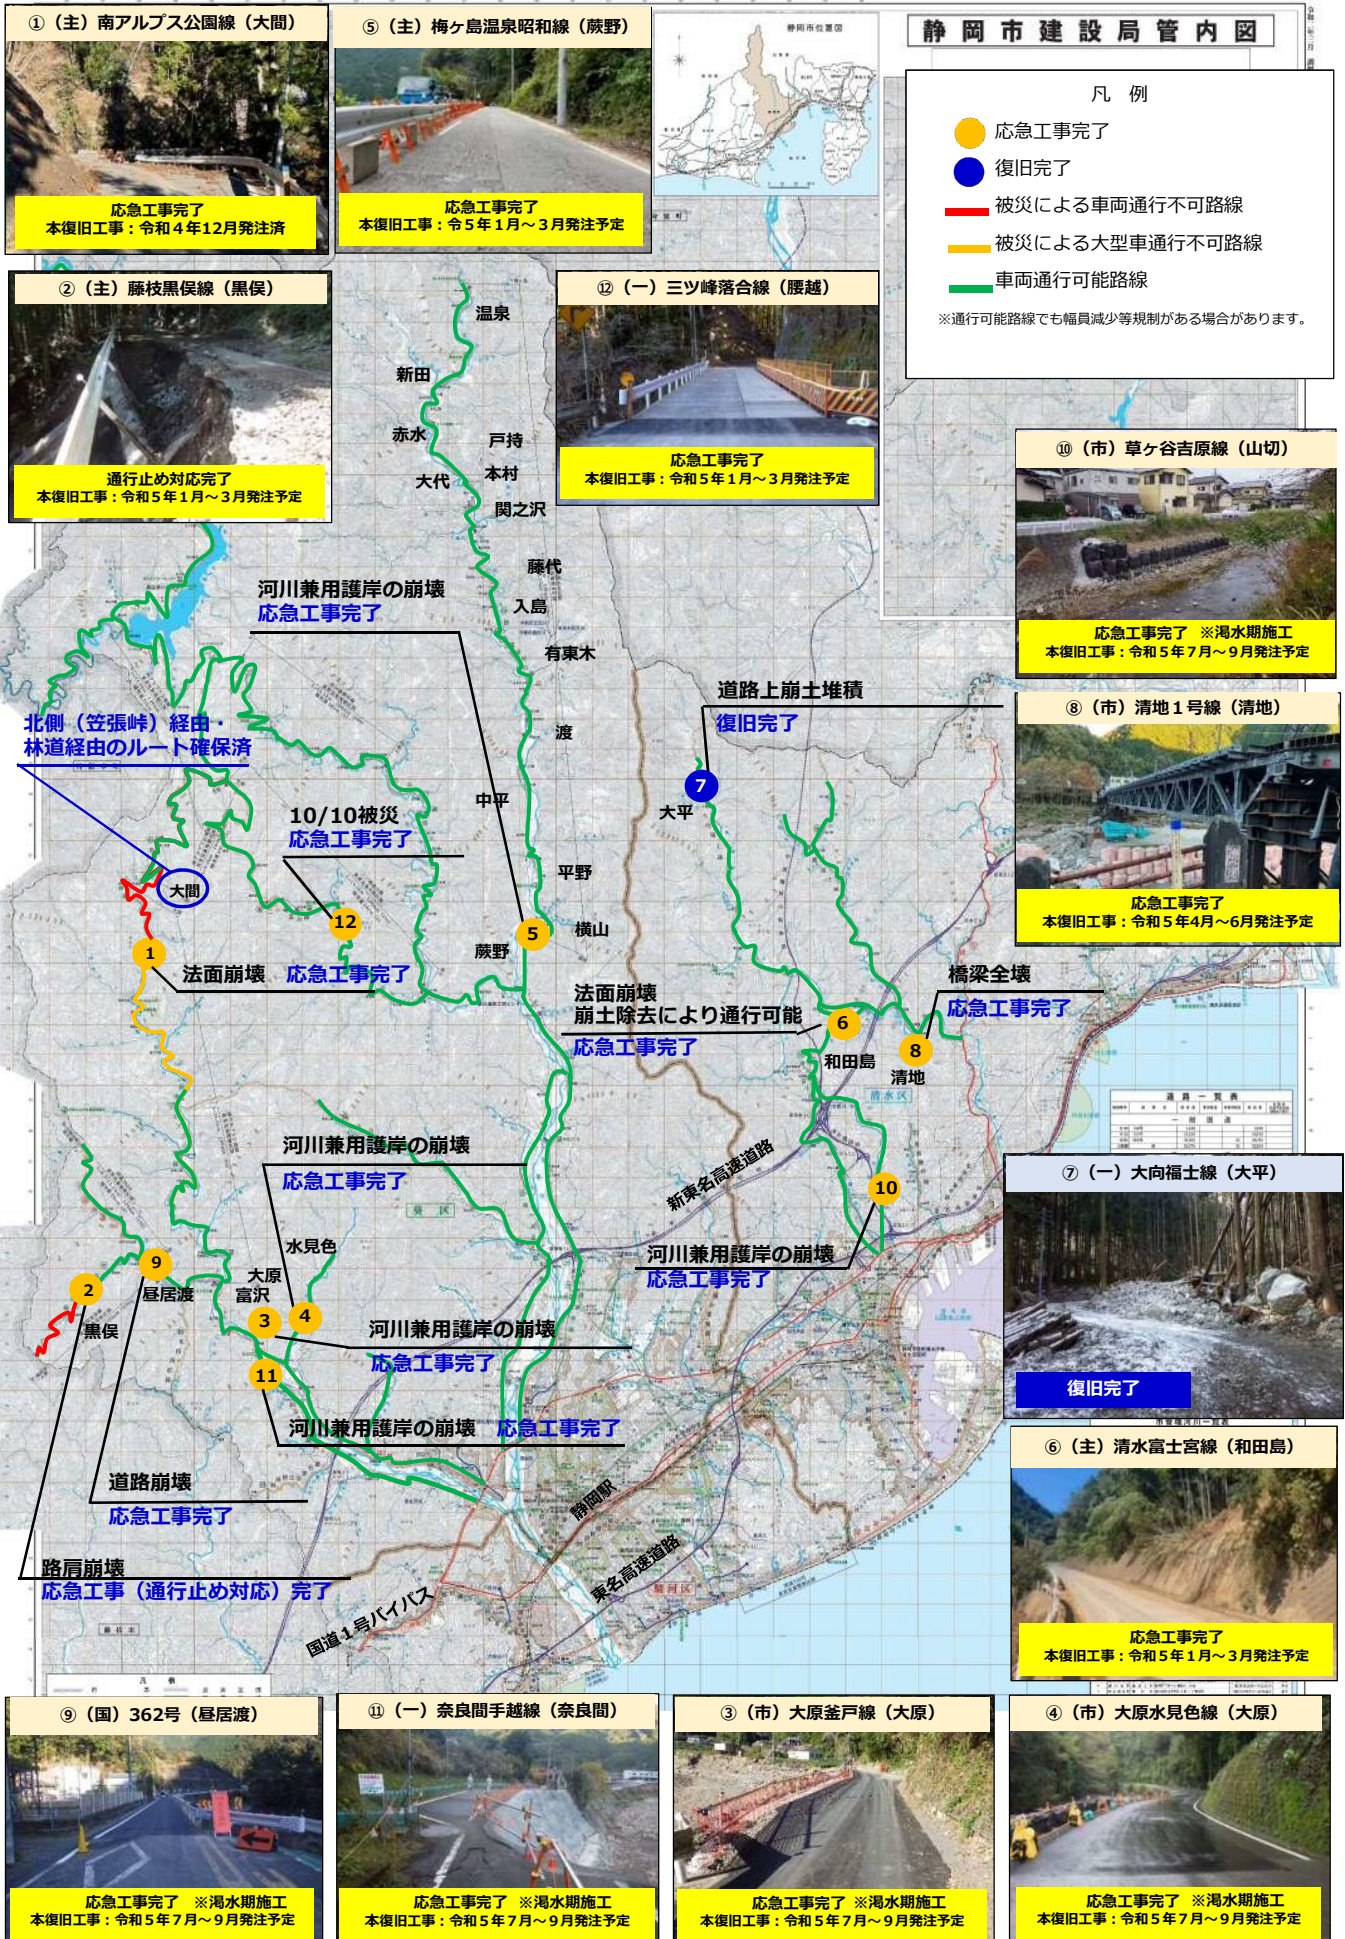

1. 主な被害状況・対策(1月20日時点)

農道関係

- ▼市内農道 1,621路線のうち、320路線で崩土・倒木・路肩欠損等が発生。
被害報告があった市内農道320路線の現地調査を実施、114路線復旧完了、38路線応急復旧済。108路線復旧対応中、残り60路線については順次対応予定。
被害報告のない1,301路線については、順次調査を行い必要に応じて修繕等を実施予定。
- ▼用水路43箇所で土砂堆積等が発生。用水路については実態の把握が困難なため、全体の把握は出来ない状況。
用水路43箇所の現地調査を実施、7箇所復旧完了、23箇所復旧対応中、残り13箇所については順次対応予定。
- ▼公共災害復旧事業は、農道11路線で15箇所、農業用水路1箇所であり、全16箇所において国の査定が完了した。
現在、復旧工事発注のための測量設計業務を進めている。
比較的小規模な工事4件を年度内を目途に発注し、残りの12件の工事についても順次、準備が出来次第発注していく。
概ね来年度末に復旧工事完了を見込んでいます。

林道・治山関係

- ▼市内林道158路線のうち110路線で崩土・倒木・路肩欠損等が発生。
被災した市内林道110路線の現地調査を実施。比較的小規模被害の31路線については、崩土撤去等が終了し通行可能な状況。
残り79路線については順次復旧作業中。
- ▼大規模に被災した8路線10箇所については、国の公共災害復旧事業の採択を受け、来年度末までに順次復旧工事の完了を見込んでいます。
- ▼市治山施設に関する土砂撤去は、31件中20件が完了。残り11件については今年度末までの完了を見込んでいます。



令和4年9月 台風15号被災箇所への復旧状況（治山林道課）

